

1.0 Información General

- 1.10. Nombre del Proyecto: Planta Fotovoltaica Super Solar
- 1.20. Ubicación: Cantón El Perical, Distrito de Tecoluca, Municipio de San Vicente Sur, Departamento de San Vicente
- 1.30. Destino del proyecto: Planta Solar fotovoltaica interconectada a red DELSUR


2.0 Información Contractual

- 2.10. Profesionales asignados al proyecto:
- 1 Gerencia de Proyecto: Super Fast S.A. de C.V.
 - 2 Supervisión de obra: OnSite PM, S.A. de C.V.
 - 3 Diseñador de proyecto: Enersys Solar, S.A.; LG Consultores S.A. de C.V.; Green Power, S.A. de C.V.
 - 4 Movimiento de tierras: Por Definir
 - 5 Construcción de obra civil y acabados: Enersys Solar, S.A. de C.V., LG Consultores S.A. de C.V. y Green Power, S.A. de C.V.
 - 6 Suministro de Estructura Metálica: Enersys Solar, S.A.
 - 7 Montaje de Estructura metálica y cerramiento: Sinergya
 - 8 Construcción de Urbanismo e infraestructura: Sinergya
 - 9 Entidad responsable de ejecutar la colocación o venta del Proyecto: N/A
- 2.30 Garantías y Seguros del proyecto
- 1 Buena inversión de anticipo
 - 2 Cumplimiento de contrato

3.0 Información sobre el Avance de Obra

- 3.10 Tiempo transcurrido y restante (Obra Civil)
- | | |
|----------------------|---------------------|
| Plazo original: | 344 días calendario |
| Plazo prórroga: | 458 días calendario |
| Tiempo transcurrido: | 458 días calendario |
| Tiempo restante: | 0 días calendario |
- 3.20 Avance del proyecto con base al presupuesto
- | | | | | | |
|-------------|------|-------|--------|-------------------|-------|
| Programado: | 100% | Real: | 99.00% | Status Retraso de | 1.00% |
|-------------|------|-------|--------|-------------------|-------|

4.0 Programa de Obra

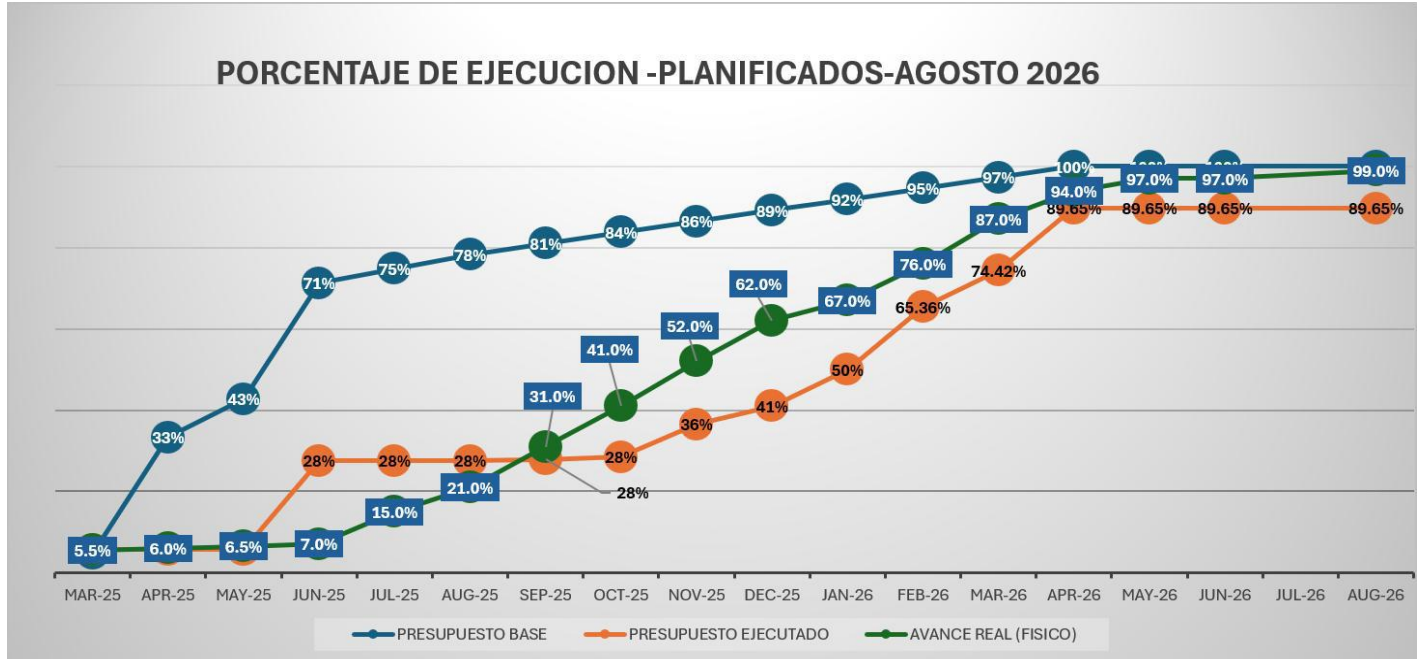

5.0 Personal, materiales, equipos y herramientas utilizados

5.10 Personal en campo

NO.	ESPECIALIDAD	CANTIDAD
OnSite-PM		
1	Supervisor civil	1
2	Supervisor electromecánico	1
Energysys		
1	Gerente de sitio	1
2	Supervisor electromecánico	1
PYP		
TOTAL		4

5.11 Materiales, equipo y herramientas

No Aplica
