

# INFORME DE AVANCE DE OBRA DE FONDO DE TITULARIZACIÓN DE INMUEBLES FTIRTNNEO

1 al 30 de septiembre de 2025

Período:

#### 1.0 Información General

1.10 . Nombre del Proyecto: Parque Industrial North Logistics NNEO Nejapa

1.20. Ubicación: Ex Hacienda Mipalapa, Carretera a Quezaltepeque.

1.30 . Destino del proyecto: Alquiler de espacios (Bodegas)

#### 2.0 Información Contractual

### 2.10 . Profesionales asignados al proyecto:

- 1 Gerencia de Proyecto: Project Management Office El Salvador (PMOES)
- 2 Supervisión de obra: Proyectos Ingeniería Arquitectura S.A (PIASA)
- 3 Diseñador de proyecto: Proyectos Ingeniería Arquitectura (PIASA)
- 4 Movimiento de tierras: Global Parts S.A de C.V
- 5 Construcción de obra civil y acabados: Cadpro El Salvador S.A de C.V
- 6 Suministro de Estructura Metálica: Medabil Industria en Sistemas constructivos Ltda
- 7 Montaje de Estructura metálica y cerramiento: Medabil Industria en Sistemas constructivos Ltda y Construcciones Nabla S.A de C.V
- 8 Construcción de Urbanismo e infraestructura: Global Parts S.A de C.V
- 9 Entidad responsable de ejecutar la colocación o venta del Proyecto: Progreso e Inversiones, S.A. de C.V.

## 2.30 Garantías y Seguros del proyecto

- 1 Buena inversión de anticipo
- 2 Cumplimiento de contrato

#### 3.0 Información sobre el Avance de Obra

3.10 Tiempo transcurrido y restante (Obra Civil)

Plazo original: 517 días calendario

Plazo prórroga: No existen prórroga en este periodo

Tiempo transcurrido: 517 días calendario
Tiempo restante: 0 días calendario

3.20 Avance del proyecto con base al presupuesto


Programado: 88% Real: 86.00% Status Retraso de 2.00%



# INFORME DE AVANCE DE OBRA DE FONDO DE TITULARIZACIÓN DE INMUEBLES FTIRTNNEO

1 al 30 de septiembre de 2025

Período:

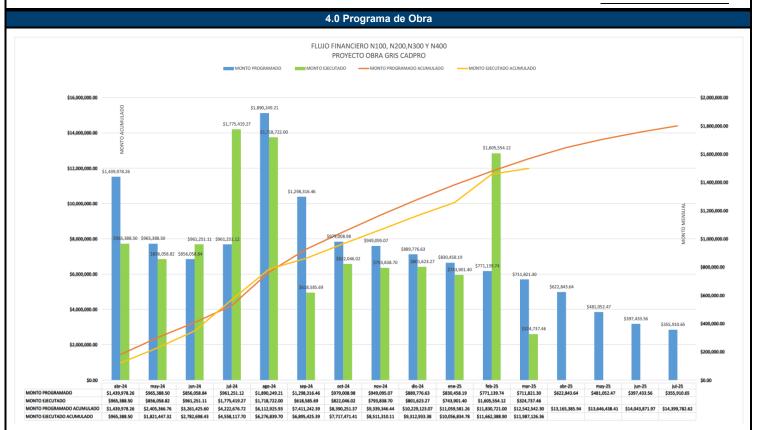

# 5.0 Personal, materiales, equipos y herramientas utilizados

#### 5.10 Personal en campo

	CATEGORÍA		
% DE CONTRATACIÓN	MASCULINO	FEMENINO	TOTAL
	72	6	78
	92.31%	7.69%	100.00%

## 5.11 Materiales, equipo y herramientas

		EN CALIDAD	
TIPO DE MAQUINARIA	MARCA	PROPIO	ALQUILADO
MOTONIVELADORA CAT	CAT	1	
RODO LISO DYNAPAC	DYNAPAC		1
CAMION 32-917			1
PIPA 77-937		1	
RETROEXCAVADORA SANY BHL75	SANY		1
AUTOHORMIGONERA	CARMIX		1
MINICARGADOR NEW HOLLAND	NEW HOLLAND		1
EXCAVADORA	KOBELCO		1
RODO PATA DE CABRA 2 TON	WACKER		1
RETROEXCAVADORA SANY 13	SANY		1
	SUB TOTAL	2	8
	TOTAL		10
